


北環線主線項目進展匯報

北區區議會

交通運輸委員會

2024年4月9日





- 最新進展
- 項目時間表
- 最新鐵路方案
- 下一步工作

北環線主線:


- ✓ 長約10.7公里，並於凹頭、牛潭尾和新田增設三個中途站
- ✓ 連接東鐵線及屯馬線，形成一個貫通新界和九龍市區的環狀鐵路

最新進展:

- ✓ 已完成法定環境影響評估程序，並於2024年2月取得環境許可證
- ✓ 正處理刊憲程序及準備刊憲修訂
- ✓ 預計2025年動工及2034年竣工




項目時間表



						現階段工作	下階段工作		
	2021年 7月	2021年 第四季	2022年 第二季	2023年 10月	2024年 2月	2023年10月至今	2024年內	2025年*	2034年*
北環線 主線	開展 詳細規劃 及設計	開展 環境影響 評估研究	開展 諮詢工作	刊憲 鐵路方案	完成法定 環評程序	處理法定反對期內 收到的意見 並籌備修訂方案刊憲	刊憲 鐵路修訂方案	開展 建造工程	完成 建造工程

*視乎實際情況或有所改變

最新鐵路方案

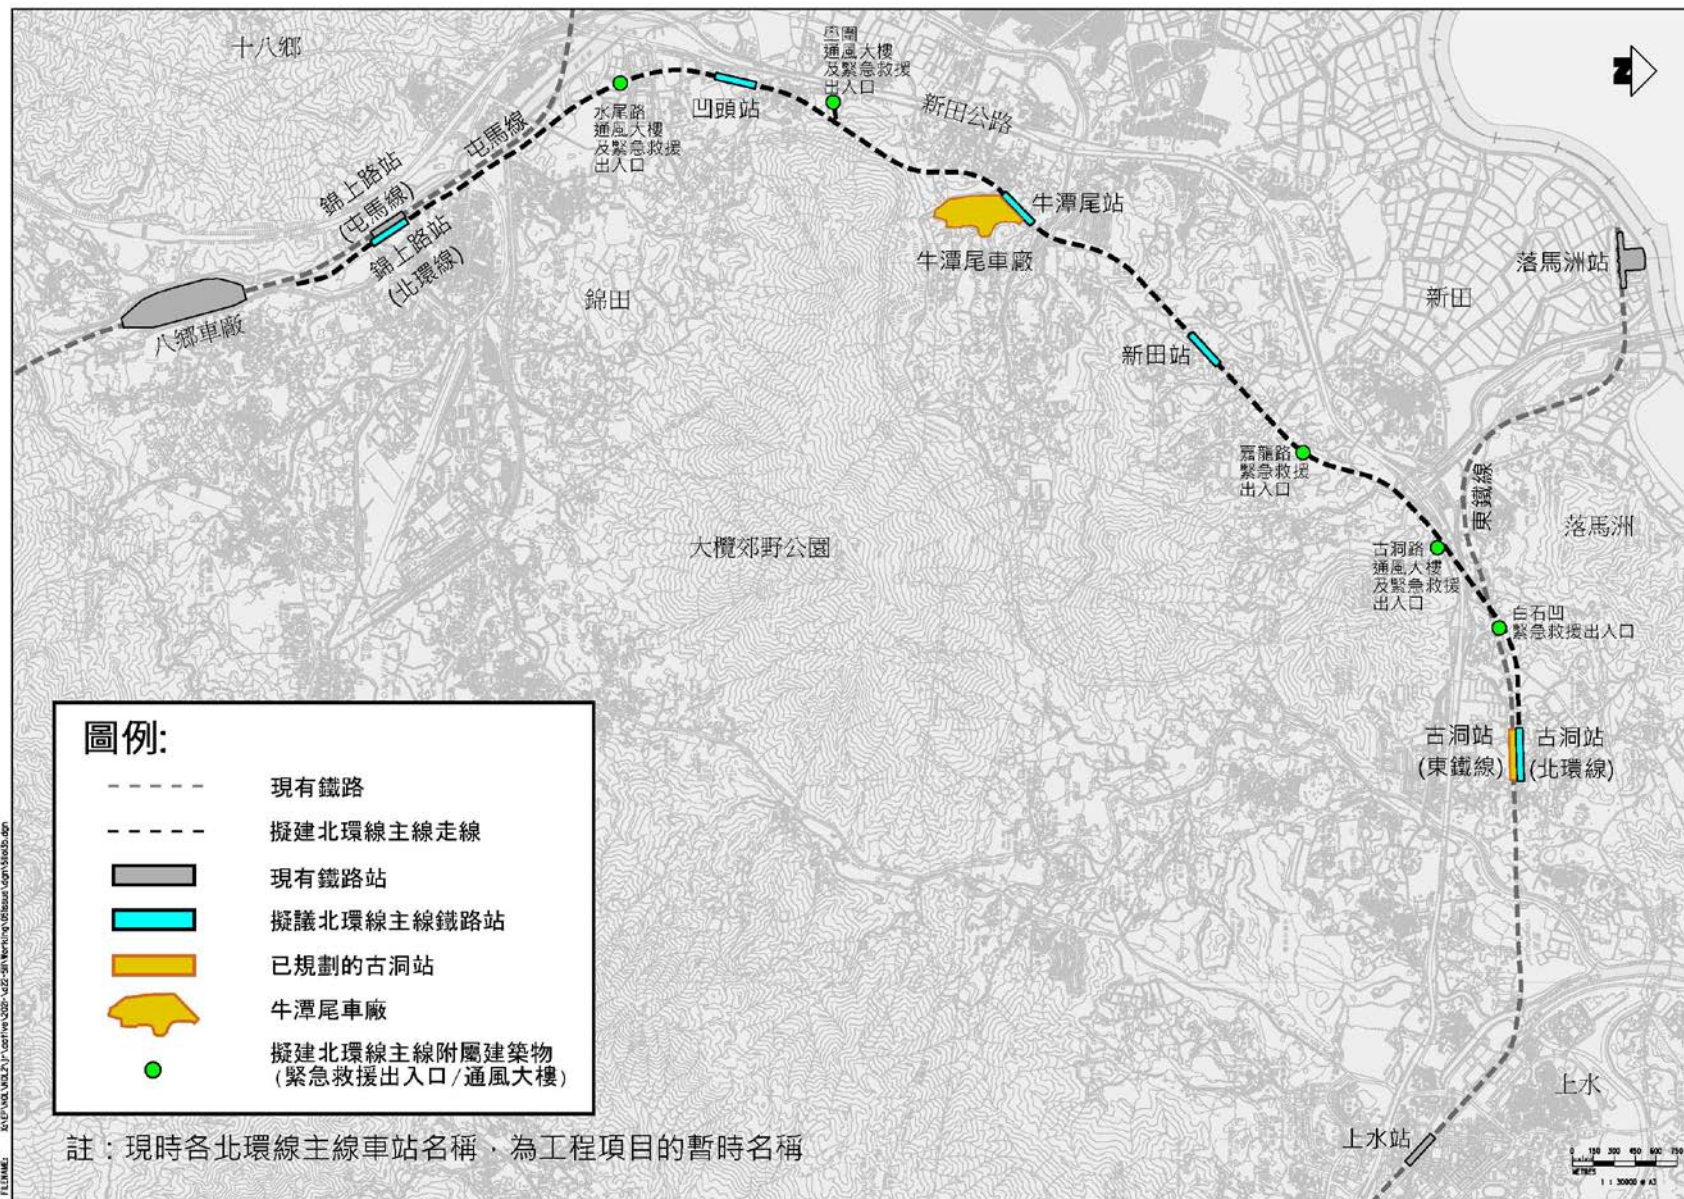

北環線主線— 下一步工作



北環線主線修訂方案刊憲

於2024年內
